

■点検調書

別紙2 様式1様式2 橋梁名・所在地・管理者名等		様式1				
橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度	34° 17' 7" 133° 47' 5"	橋梁ID 34.28527.133.78472
汐見橋 (フリガナ) シオミバシ	市道前塩屋町南北 1号線	丸亀市津森町苧池				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
丸亀市	2019.7.30	河川	有	一般道	その他	
部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)			定期点検者			
定期点検時に記録			応急措置後に記録			
部材名	判定区分 (I~IV)	変状の種類 (II以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁	II	腐食	写真1、主桁02		
	横桁	II	腐食	写真1、横桁02		
	床版	II	ひびわれ・漏水・遊離石灰	写真2、床版01		
下部構造		III	剥離	写真4、下部構造03		
支承部		III	腐食	写真3、支承0202		
その他						
道路橋毎の健全性の診断(判定区分I~IV)						
定期点検時に記録						
(判定区分)	(所見等)	鋼部材は全体的に腐食が見られる。 床版にひびわれ、漏水、遊離石灰。橋脚に大きな剥離が見られる。				
III						
全景写真(起点側、終点側を記載すること)						
架設年次	橋長	幅員				
1962年	27m	2.0m				
橋梁形式	鋼+桁橋(耐震性)					
						
			起点			終点

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

別紙2 様式1様式2



状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がII、III又はIVの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(主桁、横桁)【判定区分: II】		上部構造(床版)【判定区分: II】	
写真1		写真2	
主桁02 横桁02 支承部【判定区分: III】		床版01 下部構造【判定区分: III】	
写真3		写真4	
支承0202		下部構造03	

■LCC 検討結果

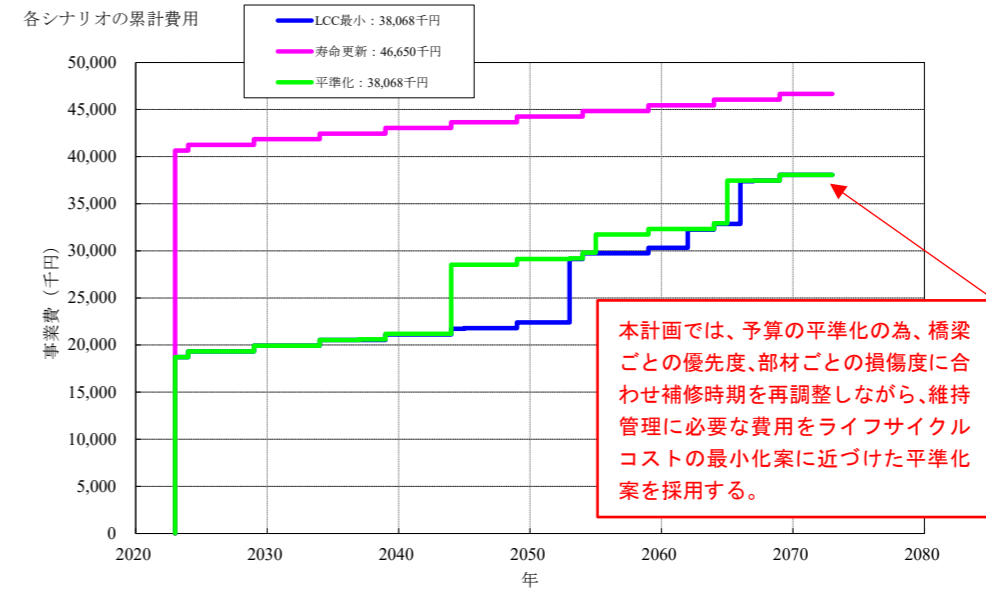

No.	対策年	部材種別	工法	事業費(千円)
1	2023	主部材	R5補修予定	11,990
2	2023	床版	R5補修予定	0
3	2023	高欄	取替(両側)	4,336
4	2023	下部工	R5補修予定	0
5	2023	伸縮装置	取替(両端)	2,400
6	2024	点検	定期点検	600
7	2029	点検	定期点検	600
8	2034	点検	定期点検	600
9	2039	点検	定期点検	600
10	2044	点検	定期点検	600
11	2045	下部工	ひび割れ注入	70
12	2049	点検	定期点検	600
13	2054	点検	定期点検	600
14	2053	高欄	取替(両側)	4,336
15	2053	伸縮装置	取替(両端)	2,400
16	2059	点検	定期点検	600
17	2062	主部材	3種ペン&塗装	1,924
18	2064	点検	定期点検	600
19	2066	床版	炭素繊維接着	4,542
20	2067	下部工	ひび割れ注入	70
21	2069	点検	定期点検	600

No.	対策年	部材種別	工法	事業費(千円)
1	2023		更新	40,650
2	2024	点検	定期点検	600
3	2029	点検	定期点検	600
4	2034	点検	定期点検	600
5	2039	点検	定期点検	600
6	2044	点検	定期点検	600
7	2049	点検	定期点検	600
8	2054	点検	定期点検	600
9	2059	点検	定期点検	600
10	2064	点検	定期点検	600
11	2069	点検	定期点検	600

No.	対策年	部材種別	工法	事業費(千円)
1	2023	主部材	R5補修予定	11,990
2	2023	床版	R5補修予定	0
3	2023	高欄	取替(両側)	4,336
4	2023	下部工	R5補修予定	0
5	2023	伸縮装置	取替(両端)	2,400
6	2024	点検	定期点検	600
7	2029	点検	定期点検	600
8	2034	点検	定期点検	600
9	2037	下部工	ひび割れ注入	70
10	2039	点検	定期点検	600
11	2044	点検	定期点検	600
12	2044	高欄	取替(両側)	4,336
13	2044	伸縮装置	取替(両端)	2,400
14	2049	点検	定期点検	600
15	2053	下部工	ひび割れ注入	70
16	2054	点検	定期点検	600
17	2055	主部材	3種ペン&塗装	1,924
18	2059	点検	定期点検	600
19	2064	点検	定期点検	600
20	2065	床版	炭素繊維接着	4,542
21	2069	点検	定期点検	600
